承德诚韵建筑工程有限公司
探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故
调查报告

2023年12月11日下午17时30分左右，承德诚韵建筑工程有限公司工人任某锋在承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟铁矿探矿工程施工期间进行巡检作业时，发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，直接经济损失约230万元，事故发生后，承德诚韵建筑工程有限公司未按照规定程序向承德县腾远矿业有限责任公司和县级以上人民政府安全生产监督管理部门及负有安全生产监督管职责的有关部门报告,瞒报该起事故。

2024年7月11日，接到承德县人力资源和社会保障局推送认定工伤决定书,提示承德诚韵建筑工程有限公司一名工人在承德县头沟镇承德县腾远矿业有限责任公司死亡，亡人姓名：任某锋。

2024年7月12日,承德县人民政府成立了由县应急管理局、县自然资源和规划局、县公安局、县总工会、县人社局、县纪委监委、头沟镇人民政府组成的核查组,对该起亡人事件进行核查。核查组经现场勘查、询问企业有关人员后确认为瞒报生产安全事故，依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规要求,核查组转为承德诚韵建筑工程有限公司探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故调查组（简称事故调查组），对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查明了事故发生的经过、原因、瞒报过程、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位和责任人提出了处理建议，并对提出了事故防范措施和建议。

一、事故责任单位及生产概况

（一）事故责任单位概况

1.承德县腾远矿业有限责任公司

承德县腾远矿业有限责任公司，法定代表人：王某，股东、实际控制人：裴某阁。注册地址：承德县头沟镇瓦房村高粱沟四组，统一社会信用代码：91130821MA07PLY466，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：铁矿石开采、加工、销售；磷矿石、钛矿石加工、销售；矿产资源（不含煤炭）、建筑材料（不含危毒品）、金属材料、烧结产品等购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司下辖一座矿山，矿山名称：承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟铁矿，采矿许可证证号：C1300002012082110126962，有效期限：2022年5月24日至2026年11月24日，开采方式：地下开采，生产规模：10万吨/年。事故发生地点为承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟铁矿460m北探矿巷穿脉，该矿2023年5月委托河北晨星地质勘查服务有限公司编制《承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟铁矿补充勘查实施方案》，2023年6月28日，承德县自然

资源和规划局出具同意承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟铁矿进行增储扩能的说明。2023年6月29日，承德县应急管理局同意该矿增储扩能。2023年11月1日，承德县自然资源和规划局出具《承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟铁矿补充勘查实施方案》符合备案要求的意见，并备案。

2.承德诚韵建筑工程有限公司

承德诚韵建筑工程有限公司，法定代表人：雷某锋，成立日期：2023年3月2日，注册地址：河北省承德市双桥区潘家沟街道万华A区16#1-401，类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91130082MACBBKU478，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；住宅室内装饰装修；公路管理与养护；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：园林绿化工程；工程管理服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）项目工程概况

2023年6月28日，承德诚韵建筑工程有限公司与承德县腾远矿业有限责任公司签订探矿工程承包合同，工程内容主要以《承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟铁矿补充勘查实施方案》为准。工程主要为：槽探5条共157米，钻探工程8孔1632米，坑探工程：460m水平沿脉、穿脉和506m水平回风巷。实际坑探工程进尺共368米。

（三）生产建设概况

承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟铁矿于2023年7月至2024年4月期间进行增储扩能工作，事故发生时处于探矿施工阶段。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年12月11日下午17时30分左右，承德诚韵建筑工程有限公司工人任某锋和邬某宝到承德县腾远矿业有限责任公司高粱沟井下进行巡检时，行至460m水平北侧探矿巷穿脉约10米左右时，任某锋用3米长的撬棍进行敲帮问顶，邬某宝在旁进行看护和照明，巷道上方冒落大块岩石将任某锋砸伤。

（二）事故救援情况

任某锋被冒落大块岩石砸伤后，工友邬某宝立即利用井下电话通知承德诚韵建筑工程有限公司朱某康，朱某康接到电话后立即通知承德诚韵建筑工程有限公司法定代表人雷某锋，雷某锋拨打中国人民解放军联勤保障部队第981医院急救电话后与朱某康开车赶到事发现场，朱某康、雷某锋、邬某宝三人将任某锋转至皮卡车将任某锋运出井外，雷某锋开车将其送外医院救治，后经中国人民解放军联勤保障部队第九八一医院抢救无效死亡。

（三）人员伤亡情况

此次事故造成任某锋一人死亡。任某锋，男，汉族，1985年10月03日出生，住址：陕西省商洛市镇安县永乐镇迎宾路一

组。身份证号：6125261985XXXX6293。


（四）善后处置情况

事故发生后，承德诚韵建筑工程有限公司法定代表人雷某锋与死者家属协商，自愿达成赔偿协议，赔偿死者家属230万元。

三、事故现场勘察情况

事故发生地点位于承德县腾远矿业有限责任公司高梁沟铁矿井下460m水平北侧探矿巷道穿脉约10米处。

（事故现场示意图）

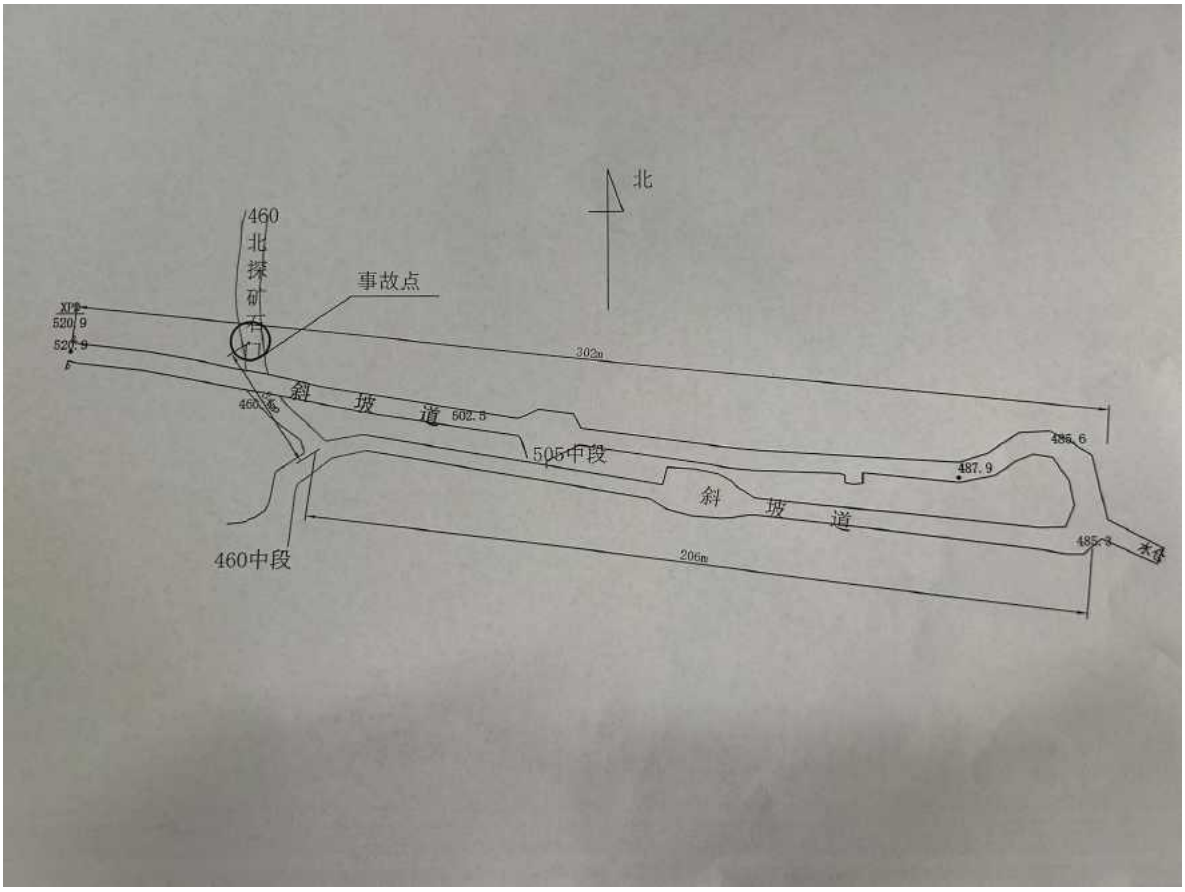

（460m水平北探矿巷道穿脉事发地点照片）





四、事故报告情况

事故发生后，现场跟班作业工人邬某宝向承德诚韵建筑工程有限公司主要负责人朱某康报告，朱某康接到报告后向公司法定代表人雷某锋报告，雷某锋和朱某康均未按照规定程序向承德县腾远矿业有限责任公司及县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，瞒报了该起事故。

五、事故原因及性质

（一）直接原因

承德诚韵建筑工程有限公司员工任某锋在未采取有效防护措施情况下敲帮问顶作业，被冒落的大块岩石砸中，致其死亡。

（二）间接原因

1.承德诚韵建筑工程有限公司敲帮问顶未得到有效的落实，执行安全管理制度不到位。

2.承德县腾远矿业有限责任公司对探矿施工单位安全管理不到位，未督促外包单位及时有效的消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，承德诚韵建筑工程有限公司探矿施工“12·11”冒顶片帮事故为一起瞒报的一般生产安全责任事故。

六、对事故责任人员和责任单位的拟处理建议

（一）建议给予行政处罚及相关处理的责任人员

1.裴某阁，男，群众，承德县腾远矿业有限责任公司实际控制人。对探矿施工单位管理不到位，未督促外包探矿的施工单位

及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由承德县应急管理局对其处以2022年年收入9.854392万元40%的罚款，计人民币3.941756万元。

2.王某，男，群众，承德县腾远矿业有限责任公司，主要负责人，负责全面工作。对外包探矿施工单位管理不到位，未督外包及时消除生产安全事故隐患，未有效组织从业人员进行安全教育培训，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由承德县应急管理局对其处以2022年年收入11.464901万元40%的罚款，计人民币4.58596万元。

3.雷某锋，男，群众，承德诚韵建筑工程有限公司法定代表人，负责承包项目全面工作。对承包的探矿工作安全管理不到位，未及时督促、检查安全生产工作，以致未能及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由承德县应急管理局对其处以2022年年收入4.6万元40%的罚款，计人民币元1.84万元的罚款。事故发生后瞒报事故，对事故瞒报负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，建议由承德县应急管理局对其处以2022年年收入4.6万元80%的罚款，计人民币3.68万元，两项合并处人民币5.52万元的罚款。

4.朱某康，男，群众，承德诚韵建筑工程有限公司主要负责人，负责承包项目的全面工作，未依法履行主要负责人职责对巡检作业、敲帮问顶等排险作业管理缺失，安全管理不到位，未及时督促、检查安全生产工作，以致未能及时消除生产安全事故隐患，未有效组织开展员工岗前安全教育培训，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，建议由承德县应急管理局对其处以2022年年收入5.5万元40%的罚款，计人民币元2.2万元。事故发生后瞒报事故，对事故瞒报负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款的规定，建议由承德县应急管理局对其处2022年年收入5.5万元80%的罚款，计人民币4.4万元，两项合并处人民币6.6万元的罚款。

（二）建议对事故责任单位的行政处罚

1.承德县腾远矿业有限责任公司。未督促外包探矿施工单位有效消除生产安全事故隐患，未有效组织从业人员安全教育培训，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，建议承德县应急管理局对其处人民币61万元的罚款。

2.承德诚韵建筑工程有限公司。隐患排查不到位，未能及时消除生产安全事故隐患，安全教育培训流于形式，未有效组织员工岗前安全教育培训，致使从业人员辨别风险能力和安全防范意识差，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生

产法》第一百一十四条第一项的规定，建议承德县应急管理局对其处人民币61万元的罚款。事故发生后瞒报事故，对事故瞒报负有直接责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定，建议承德县应急管理局对其处人民币130万元的罚款，两项合并处人民币191万元的罚款。

七、对监管责任人员的拟处理意见建议

（一）头沟镇

1.刘某旭，2020年5月至今任头沟镇应急管理办公室主任，负责辖区内安全生产工作，对承德诚韵建筑工程有限公司探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故及其他四起瞒报事故负有直接责任。建议给予其政务警告处分。

2.高某森，2023年1月至今任头沟镇政府副镇长，分管辖区内安全生产工作，对承德县诚韵建筑工程有限责任公司高梁沟铁矿探矿工程“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故及另外一起事故负有主要领导责任，建议给予其批评教育。

3.于某贺，2020年6月至2024年5月任头沟镇政府镇长，负责全镇工作，对承德诚韵建筑工程有限公司探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故及其他四起瞒报事故负有重要领导责任，建议对其批评教育。

（二）县应急局

1.张某志，2020年9月至今任承德县应急局非煤矿山股股长，负责全县非煤矿山安全生产监管工作，对承德诚韵建筑工程

有限公司探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故及其他四起瞒报事故负有直接责任，建议给予其政务警告处分。

2.范某远，2017年11月至今任承德县安全生产监督管理局副局长、承德县应急管理局党委委员、副局长，分管全县非煤矿山安全生产监管工作，对承德诚韵建筑工程有限公司探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故及其他四起瞒报事故负有主要责任，建议给予其诫勉。

3.张某国，2021年7月至今任承德县政协副主席，2020年6月至今任县应急局局长，负责县应急局全面工作，对承德诚韵建筑工程有限公司探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故及其他四起瞒报事故负有主要责任负有重要领导责任，鉴于其为市管干部，建议将其有关问题线索上报市纪委。

（三）县自规局

1.薄某闵，2021年2月至今任承德县自然资源和规划局地质勘查管理股副股长，负责矿山企业增储扩能监督管理工作，对承德诚韵建筑工程有限公司探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故负有直接责任。建议给予其诫勉。

2.刘某瑞，2021年2月至今任承德县自然资源和规划局地质勘查管理股负责人，负责矿山企业增储扩能监督管理工作，对承德诚韵建筑工程有限公司探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故负有主要领导责任。建议给予其批评教育。

3.孙某国，2022年8月任承德县自然资源和规划局副局长，

分管地质勘查管理股，负责矿山企业增储扩能监督管理工作，对承德诚韵建筑工程有限公司探矿施工“12·11”一般冒顶片帮瞒报事故负有重要领导责任。建议对其提醒谈话。

八、事故防范和整改措施建议

（一）承德县腾远矿业有限责任公司及承德诚韵建筑工程有限公司要加强对从业人员的安全教育培训，压实生产经营单位法定代表人、主要负责人及从业人员依法依规及时、如实报告生产安全事故的责任意识，杜绝瞒报事故行为。

（二）承德县腾远矿业有限责任公司要加强对外包施工队伍的管理，强化对外包单位主要负责人安全教育培训，压实外包单位法定代表人、主要负责人依法依规及时、如实报告生产安全事故责任意识。

（三）承德诚韵建筑工程有限公司要认真落实企业主体责任，切实补强安全管理短板，切实加强安全生产管理工作。

（四）要举一反三，深刻吸取事故教训，深刻剖析事故原因，研究制定切实可行的防范举措，警钟长鸣杜绝事故发生。
